

ANEJO Nº11

Plan de Obra

Índice

1	Introducción	1
2	Descripción del plan de trabajos	2
2.1	Fase 1	2
2.2	Fase 2	2
3	Plazo de ejecución de la obra	3

APÉNDICE 11.1. PLAN DE OBRA

1 Introducción

El objeto del presente Anejo es definir la fases de obra y su Plan de Obra en el presente “**Accesibilidad a San Juan de Gaztelugatxe. Fase 2**”.

Del análisis del Plan de Obra se deduce cuáles son las actividades más críticas, a las cuales se deberá dedicar una mayor atención durante la ejecución de los trabajos para evitar que, debido a causas no previstas, se originen retrasos o paralizaciones en otros tajos a los cuales condicionan, lo que supondría una alteración importante tanto en los costos como en los plazos estimados.

2 Descripción del plan de trabajos

El presente proyecto contempla la ejecución de la reordenación de la actual intersección de acceso a San Juan de Gaztelugatxe. Para poder realizar las obras asegurando la mínima afección al tráfico de la BI-3101, se ejecuta por fases.


La definición de las fases de obra y los desvíos de tráfico necesarios se han definido de forma conjunta en el capítulo 11 del documento de planos. A continuación se describen las fases planteadas.

2.1 Fase 1

En esta fase se ejecutará las obras de ampliación de plataforma para la ejecución del aparcamiento de Mendebalde. Las obras principales a ejecutar en esta fase son:

- Movimiento de tierras
- Muros de contención


Para el acceso a las obras se realizar por una pista existente a la cual se accede desde el parking del Eneperi.

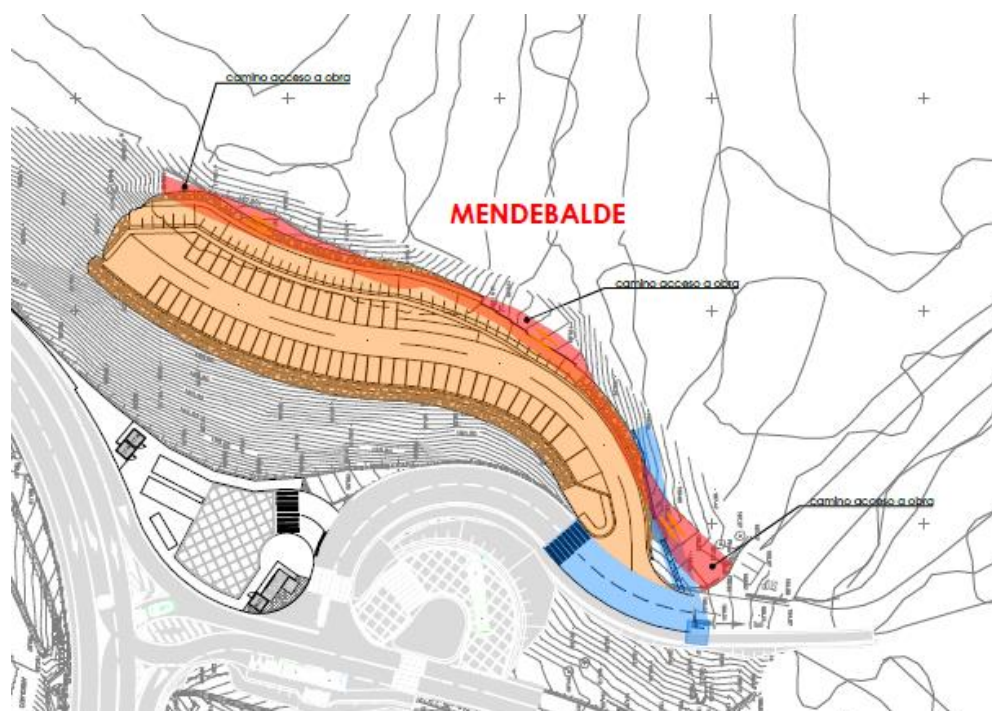

Una vez completadas las obras de ampliación de la plataforma, se acometerá la ejecución de la nueva ODT bajo el vial del Eneperi.

2.2 Fase 2

Una vez completadas las obras de la nueva plataforma de aparcamiento de Mendabalde se procede a la adecuación de la plataforma existente. En la que la obra principal a realizar es la reurbanización de la plataforma para su adecuación como parking de autobuses.

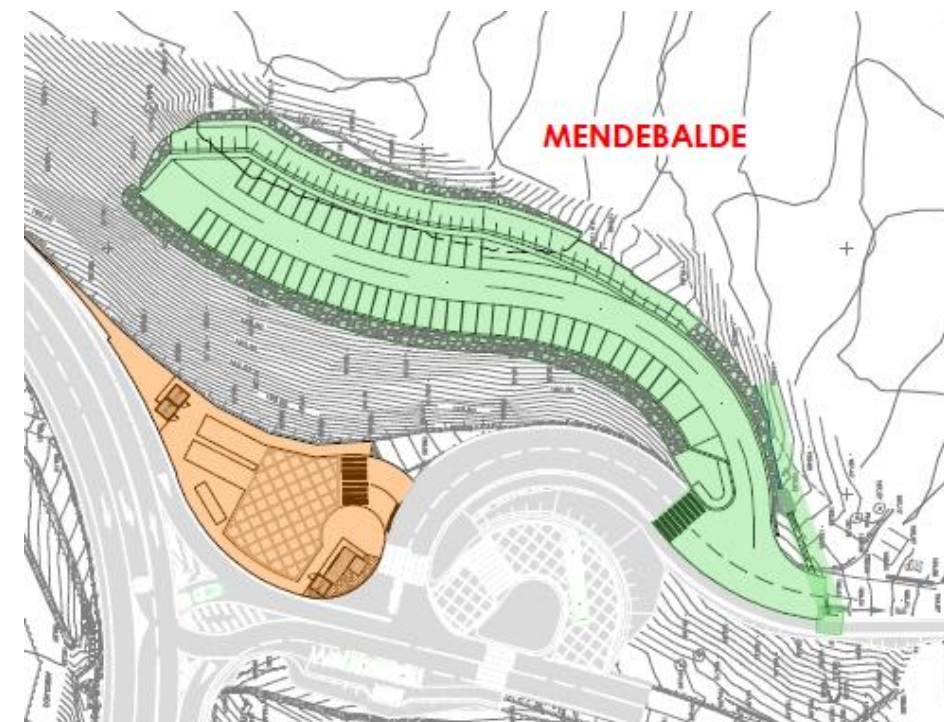

3 Plazo de ejecución de la obra

El tiempo estimado para la realización de los trabajos que componen las diferentes obras del presente Proyecto es de **trece meses (13) meses**.

APÉNDICE 11.1

Plan de Obra

