

ANEJO Nº10

Plan de Obra

Índice

1	Introducción	1
2	Descripción del plan de trabajos	2
2.1	Acceso al polígono Martiartu	2
2.2	Ejecución Muro de Micropilotes	2
3	Plazo de ejecución de la obra	3

APÉNDICE 10.1. PLAN DE OBRA

1 Introducción

El objeto del presente Anejo es definir la fases de obra y su Plan de Obra en el presente “**P.C. de senda ciclable entre el polígono Agirre y Martiartu (Arrigorriaga)**”.


Del análisis del Plan de Obra se deduce cuáles son las actividades más críticas, a las cuales se deberá dedicar una mayor atención durante la ejecución de los trabajos para evitar que, debido a causas no previstas, se originen retrasos o paralizaciones en otros tajos a los cuales condicionan, lo que supondría una alteración importante tanto en los costos como en los plazos estimados.

2 Descripción del plan de trabajos

El presente proyecto contempla la ejecución de una nueva senda ciclable que dote de conexión entre los polígonos de Agirre y Martiartu. La mayor parte del trazado se proyecta en la ladera ubicada entre la BI-625 y el río Nervión, habiendo interferencia con terceros únicamente al final del tramo donde comparte trazado con el acceso al polígono de Martiartu.

2.1 Acceso al polígono Martiartu


Para ejecutar la nueva senda ciclable sobre la plataforma que dota de conexión con el polígono de Martiartu, se debe estrechar la plataforma a carriles de 3 m de anchura en la mayor parte del trazado. Se ejecutarán las obras en dos fases, para realizar primero la acera de la margen derecha y en una segunda fase se ejecuta la acera que queda al otro margen. .

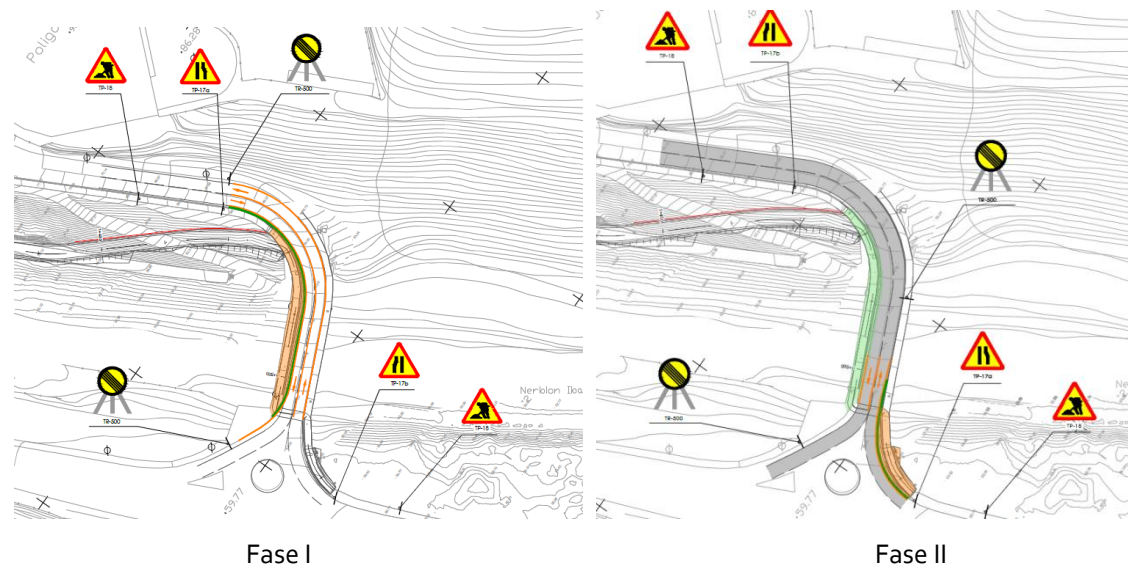

Una vez completadas las obras de ejecución de la senda ciclable se procederá al reasfaltado del acceso al polígono, el cual se realizara en horario nocturno, para afectar lo menos posible a la actividad cotidiana del mismo.

2.2 Ejecución Muro de Micropilotes

El trazado que discurre paralelo al polígono de Martiartu, más concretamente entre los PK 1+380-1+450 debido a su proximidad con el mismo y el desmante de ejecución necesario se proyecta un muro de micropilotes. Para la ejecución del mismo se requiere de un relleno provisional con material procedente de la obra, que permite acceder a la maquina.

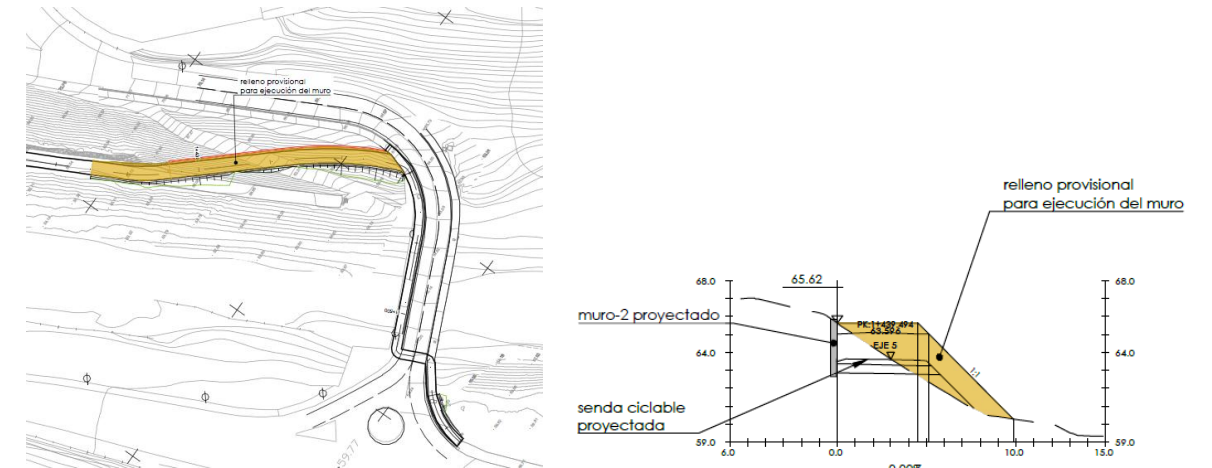

3 Plazo de ejecución de la obra

El tiempo estimado para la realización de los trabajos que componen las diferentes obras del presente Proyecto es de **ocho meses (8) meses**.

APÉNDICE 10.1

Plan de Obra

